

문서번호	교육지원과-130
보존년한	
결재일자	2017. 01. 03.
공개여부	대국민 공개

주무관	도서관설립장	교육지원과 과장	복지교육국장	부구청장	구청장
					2017. 1. 3.
신경호	김현근	우현애	이봉선	서노원	김수영
협	목4동장	최병호			
조	건축과장	박승길			
	일자리경제과장	김영흠			
	도서관운영팀장	유동식			

소통·공감·참여 **다함께** 행복한양천!

목4동 작은도서관 조성 변경계획



2017. 01. 03.

복지교육국
(교육지원과)

목4동 작은도서관 조성 변경계획

목4동시장 공동주차장 및 공유센터 건립추진 중 2층에 조성 예정이었던 생활밀착형 작은 도서관을 공유센터 3층으로 위치를 변경하여 추진하고자 함.

I 추진근거

- 구청장 공약사업 : 교육문화시설이 부족한 지역에 연차적으로 1동1작은 도서관 설립을 통한 교육문화 인프라 확충
- 1동 1작은 도서관 조성 중기계획 (교육지원과-12398, 2014.10.27)
- 목4동 작은도서관 조성 계획 (교육지원과-11953, 2016.6.28)
- 현안시책회의 결과통보(기획예산과-16140, 2016.11.15)

II 사업개요

구 분	기 준	변 경 (1차)	최 종(안)
위 치	목4동 주민센터 2층	공유센터 2층	공유센터 3층
면 적	137㎡(40평)	180㎡(55평)	전용 250㎡(76평) ※3층 면적 339㎡
사업기간	2015. 3. ~ 6.	2016. 5 ~ 2017. 3	2017. 1 ~ 2017. 5
소요예산	150백만원	150백만원	269.6백만원

- 최종(안) 결정 : 공유센터 3층 증축 및 도서관 이전(2016. 11. 10 시책회의)
 - 목4동시장 공동주차장·공유센터 건물 증축 (일자리경제과, 건축과)
 - 기존 2층 도서관 위치에 아이맘 카페 신설 (출산보육과)

- 센터 3층(증축)에 도서관 조성 (교육지원과)

III

목4동시장 공동주차장 및 공유센터 건립 추진현황

- 공사기간 : 2016. 9 ~ 2017. 5
- 건립시설 : 주차장, 도서관, 장난감 도서관, 육아카페 등
- 변경 건립규모 : 지상3층, 연면적 801m²
 - 1층 : 30m² (피로티 구조, 주차장 24면 조성)
 - 2층 : 432m² (장난감도서관, 육아카페 등 조성)
 - 3층 : 339m² (작은도서관)
- 소요예산 : 2,391백만원

IV

그간 추진경과

- 2016. 2. 26 : 공동주차장 및 공유센터 건립 계획 수립(일자리경제과)
- 2016. 4. 1 : 건축 설계용역 착수(건축과)
- 2016. 5. 23 : 목4동 작은도서관 설계 착수(교육지원과)
- 2016. 7. 12 : 목4동 작은도서관 인테리어 설계준공(교육지원과)
- 2016. 7. 19 : 건축 설계준공(건축과)
- 2016. 9. 22 : 건축공사 착공(건축과)
- 2016. 11. 10 : 증축 및 도서관 3층이전 등에 관한 현안시책회의
- 2016. 11. 21 : 공유센터 설계변경 및 낙찰차액 사용계획 수립(일자리경제과)
- 2016. 11. 24 : 공유센터 설계변경 계약의뢰(건축과)

V

세부추진 계획

1. 주요내용

- 공사기간 : 2017. 3 ~ 4월 예정 (건축공사 일정을 감안하여 진행)
- 조성규모 : 339㎡(목4동 시장 공동주차장 및 공유센터 3층)
- 면적구성(안)

계	도서관 (전용면적 250㎡)			기타 공용공간 (화장실, 로비 등)
	도서관	유아열람실 등	프로그램실	
339㎡	136㎡	74㎡	40㎡	89㎡

☞ 테라스공간 : 92㎡ 별도

□ 조성내용


- 일반자료실(1실) / 유아열람실, 프로그램실, 기타 커뮤니티 공간 등(2실)

※ 당초 단실 180㎡ ⇒ 변경 양실 250㎡

구 분	계	일반자료실	유아열람실	프로그램실	기 타
당 초	180㎡	120㎡	27㎡	33㎡	
변 경(안)	250㎡	136㎡	39㎡	40㎡	35㎡

- 소요예산 : 269,662백만원 (명시이월 141,662, '17년 본예산 128,000)

2. 관련 도면

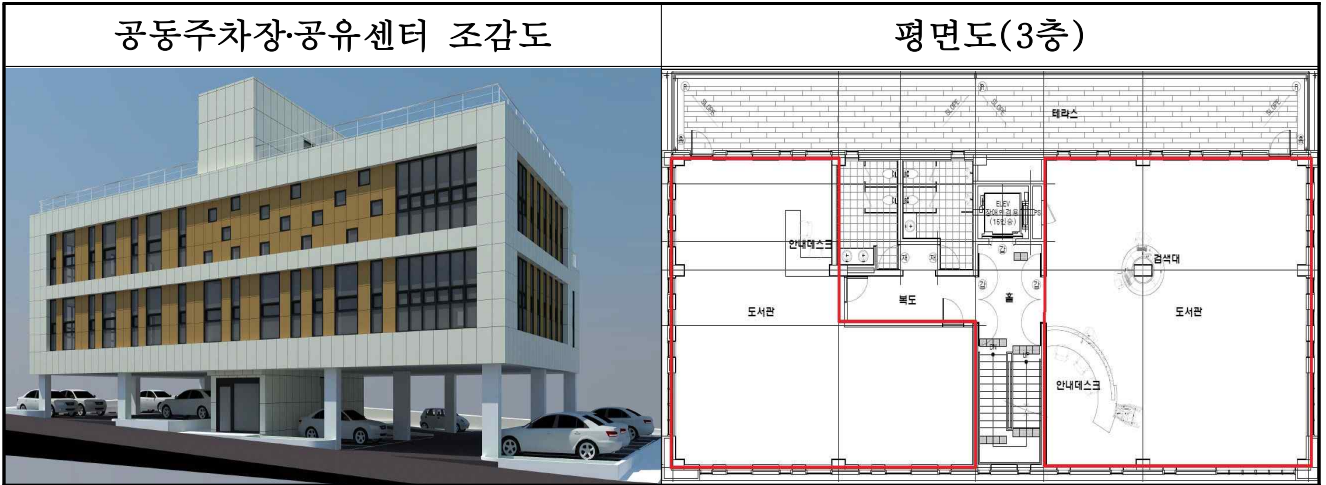

3. 공사방법

□ 내부 인테리어 공사 : 입찰에 의한 계약 등

○ 관련근거 : 지방계약법 제9조 및 동법 시행령 제20조, 지방자치단체 입찰 및 집행기준(행정자치부 예규 제 40호) 등

□ 물품취득 : 조달발주 및 수의계약 등

○ 관련근거 : 조달사업에 관한법률 제5조 2항 및 동법 시행령 제9조 3항 2호, 지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호

4. 향후 추진일정(안)

□ 2017. 1. : 목4동 작은도서관 인테리어 설계

□ 2017. 3. ~ 4. : 공사착공 (건축공사 진행일정에 맞추어 착수)

□ 2017. 5. ~ 6. : 준공 및 개관준비

VI

행정사항

□ 일자리경제과 : 목4동 작은도서관 조성 제반사항 협조

○ 공사 진행일정 및 내부 공사에 따른 제반사항 협조

□ 건축과 : 인테리어 공사 협조

○ 천정·바닥 마감 및 도서관 평면구성에 따른 전기·통신 등 인테리어 공사 협의.

□ 목4동 주민센터 : 주민홍보 협조

○ 공사 현황 및 향후 진행사항 등 문의 시 안내 및 홍보.

붙임 : 목4동 작은도서관 조성 계획 1부. 끝.
